

週間報告

建築部

期間: 令和 2年 7月 20日 ~ 令和 2年 8月 2日

	先週実績	備考
20 (月)	プレサンス西崎: 北棟14階(15SL)コン打設 6階タカラ住設搬入 7階クロス開始	プレサンスもろまち: ふくまち検査(15:00~)
21 (火)	プレサンス西崎: 2階内部社内検査(10戸) ・ベアーズコンド: 外部足場解体完了	
22 (水)	那覇A特別支援学校: 基礎埋め戻し(A工区) ・久良波賃貸: 1階壁枠返し・締固め 伊平屋製糖付属棟: 排水処理棟 槽内防蝕防水 浄水処理棟 外壁左官補修 海水ポンプ室 埋戻し	プレサンスもろまち: 施主・設計検査(9:30~)
23 (木)	伊平屋製糖施設: 1階事務所棟壁クロス貼り 1階バカス室軽鉄間仕切り組 2階2・3・4工区電気配管 外部給水配管	プレサンスもろまち: 施主・設計検査(9:30~)
24 (金)	久良波賃貸: 1階梁・スラブ配筋 ・プレミスト北谷: 杭工事 杭No,27,28 打込	
25 (土)	古波蔵三丁目: 13階躯体コン打設(B棟) ・曙3丁目: 杭No.53打込	杭52/63本完了
26 (日)		
	今週予定	備考
27 (月)	エンズ北谷: 7階躯体コン打設(8SL) ・プレミスト北谷: 杭施工NO,31完了	プレミスト北谷アラハ: サンプルルーム中間検査
28 (火)	伊平屋製糖施設 1階事務所棟壁クロス貼り 2階バカス室軽鉄間仕切り組、2・3・4工区電気配管 外部給水配管	
29 (水)	伊平屋製糖: 排水処理棟 勾配左官補修 海水ポンプ室 外部足場設置 1階壁・柱枠地組	+店社安全パトロール
30 (木)	プレミスト北谷: 杭打機解体・機材搬出 ・那覇A特別支援学校: 捨てコン打設(A工区)	
31 (金)	プレサンス西崎: 南棟15階コン打設(16SL) 12階サッシ建付け 久良波邸: 1階躯体コン打設(2SL)	※代理人会議(16:00~17:30) 協力業者安全表彰式(14:00: 本社2階会議室)
8月1日 (土)	ベアーズコンド: 4F~6F浴室タイル貼、外構雨水埋設配管 ・曙3丁目: 杭No,55打込	曙3丁目: 杭61/63本完了
2 (日)		
<input type="checkbox"/> 懸案事項・問題点		
<p>※今日の朝会で社長・安谷屋専務より、各現場での慰労会(飲み会)を自粛するようにとの通達がありました。ご存じのように連日、新型コロナウイルスの感染者が増えています。昨日も県内新規感染者が6人と報道がありました(米軍は別)。これから観光客の来県も増加すると思われるので特に観光客が多く集まる場所や居酒屋での飲み会はなるべく避けるようにしてください。各代理人はじめ社員一人々が危機感をもって行動してください。</p>		
<p>※ベアーズコンドミニウム新築工事: 変更工事の為、クロス工事ストップ(7/31に決定予定)</p>		
<p>※プレミスト北谷アラハ新築工事: サンプルルーム完了予定(8/31)</p>		
<input type="checkbox"/> 現場工程予定・他		
古波蔵三丁目(A棟): 外壁塗装進行中、屋上防水進行中		
古波蔵三丁目(B棟): 8/13(木)14階躯体コンクリート打設(RSL)、8/20(木)パラペットコンクリート打設(請求書はパラペットコンクリート打設後)		
プレミスト北谷アラハ新築工事: 7/27杭工事完了、8/5土留め工事開始、8/12土工事開始		
<input type="checkbox"/> クレーム・顧客相談・その他		
随時対応中(山口)		
<input type="checkbox"/> 定期点検		
<input type="checkbox"/> 休暇・出張等(予定)		<input type="checkbox"/> (実績)
		7/20(月)プレサンス西崎: 北棟14階(15SL)コン打設
		7/25(土)古波蔵三丁目: 13階躯体コン打設(B棟)

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 北東側 15階躯体工事



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 南西側 15階躯体工事



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 南棟 15階型枠建て込み



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 北棟 14階(15SL)コン打設



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 11階 サッシ建付け完了 先行壁



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 9.8階 軽鉄木内装工事



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 6階 クロス完了 キッチン搬入



現場名 プレサンスロジェ西崎レーヴタワー新築
作業内容 2階 クリーニング完了

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 現場全景



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 現場全景



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、杭芯確認状況



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、杭掘削深度確認状況



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、杭資材研修確認状況



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、セメントミルク配合確認状況



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、ジョイントプレート確認状況



現場名 プレミスト北谷アラハ新築工事
作業内容 ERI管理杭立会い、最終深度確認状況

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	福祉活動(伊平屋村立保育所)花火・お菓子セット贈呈



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	事務所棟クロス下地施工状況



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	福祉活動(伊平屋村立保育所)花火・お菓子セット贈呈



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	事務所棟クロス下地施工状況




現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	附帯工事K”配線ピット枠組み状況



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	外部腰壁塗装状況



現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	附帯工事K”配線ピット枠組み状況

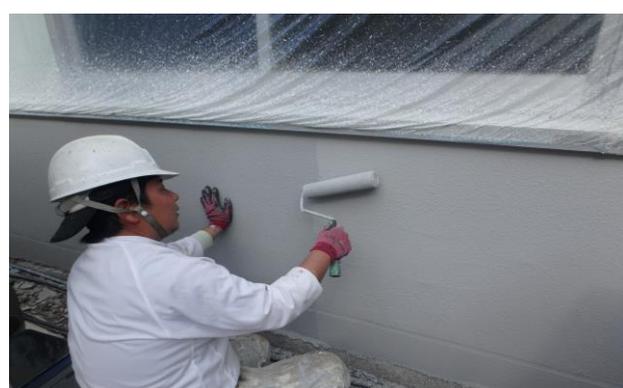

現場名	伊平屋製糖施設
作業内容	外部腰壁塗装状況

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	全景



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	全景



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	全景



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	掘削状況



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	オーガー掘削鉛直確認状況



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	オーガー掘削鉛直確認状況



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	掘削完了段取り替え状況



現場名	曙3丁目新築工事
作業内容	オーガー径確認状況

工 事 写 真

2020. 7. 17～7. 23




現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 外観(東面)



現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 外観(西面)



現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 8階梁配筋完了

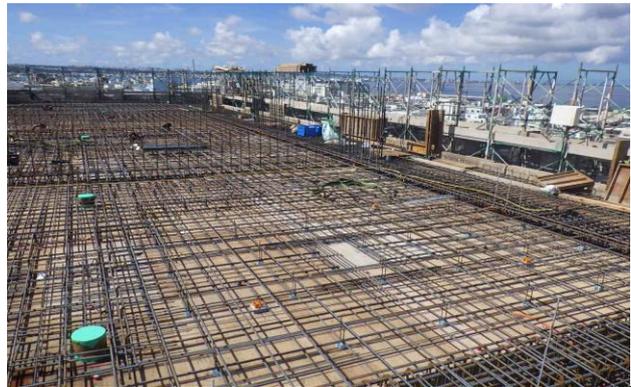

現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 8階スラブ配筋完了



現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 3階サッシモルタル詰め



現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 2階硝子取付完了



現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 2階UB設置状況




現場名 エス北谷浜川 新築工事
作業内容 大三建装土間コン打設依頼

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 排水処理棟 槽内防食防水施工状況

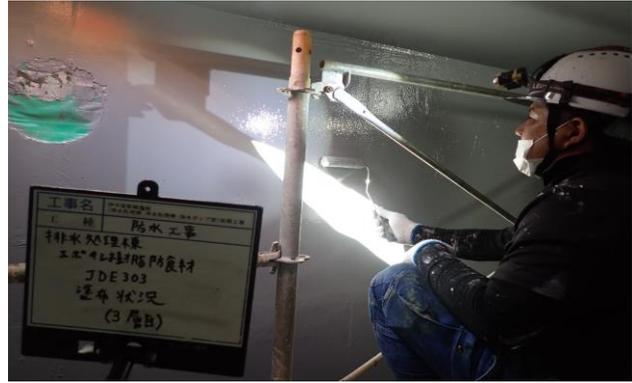

現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 排水処理棟 槽内防食防水施工状況



現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 浄水処理棟 1階壁・柱枠解体状況



現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 浄水処理棟 1階壁・柱枠解体完了



現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 海水ポンプ室 埋戻し状況



現場名 伊平屋製糖施設(排水処理棟・浄水処理棟・海水ポンプ室)新築工事
作業内容 海水ポンプ室 埋戻し状況



現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 1F壁枠返し



現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 2Fスラブ張り

工事写真

2020.7.17~7.23



現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 2Fスラブ張り



現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 2Fスラブ張り




現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 2Fスラブ梁配筋



現場名 久良波賃貸住宅新築工事
作業内容 2Fスラブ梁配筋



現場名 古波蔵三丁目
作業内容 現場全景(B棟)13階躯体工事進行中

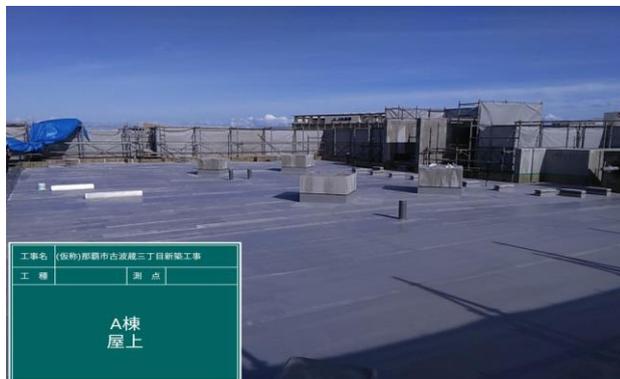

現場名 古波蔵三丁目
作業内容 屋上ウレタン防水(A棟)



現場名 古波蔵三丁目
作業内容 外装タイル抜取接着率確認(A棟)



現場名 古波蔵三丁目
作業内容 外装タイル(A棟)

工事写真

2020. 7. 17~7. 23



現場名 古波蔵三丁目
作業内容 外壁塗装(A棟)



現場名 古波蔵三丁目
作業内容 14階スラブ配筋(B棟)



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 空撮(西)



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 空撮(南)



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 空撮(東)



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 空撮(北)



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 ピット廻り防水



現場名 那覇A特別支援学校(仮称)新築工事
作業内容 アンカー墨出し

工事写真

2020.7.17～7.23




現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	全景



現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	全景



現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	浴室タイル貼

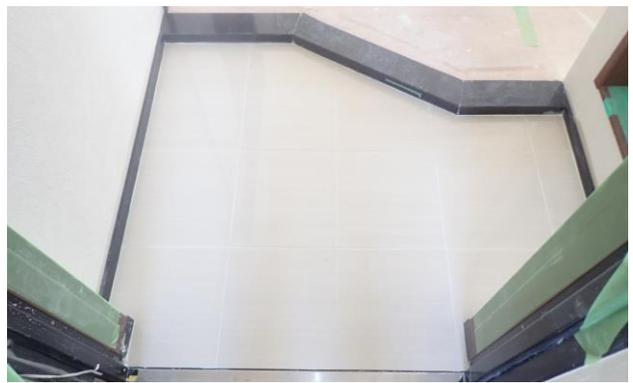

現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	玄関タイル貼




現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	照明器具取付



現場名	(仮称)ベアーズ Condominium 新築工事
作業内容	照明器具取付



現場名	プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容	施主・設計 竣工検査状況

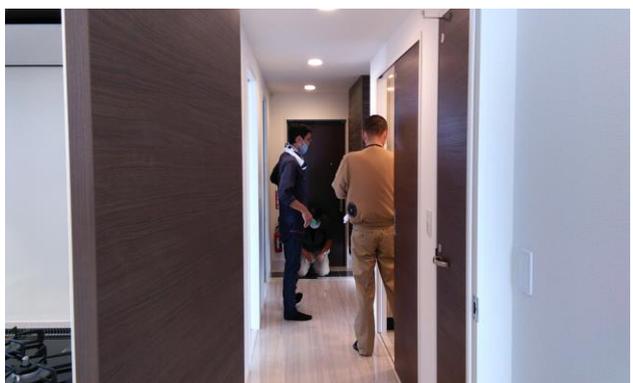

現場名	プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容	施主・設計 竣工検査状況

工 事 写 真

2020.7.17~7.23



現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況




現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況



現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況




現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況

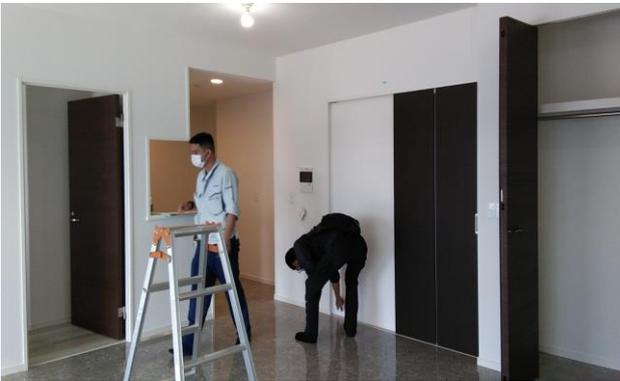

現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況



現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況

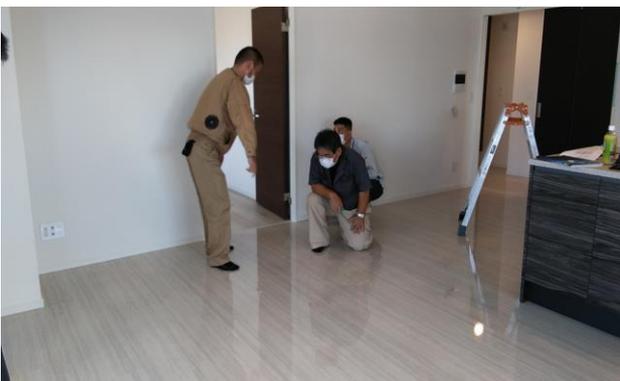

現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況



現場名 プレサンスロジェおもろまちレーブ新築工事
作業内容 施主・設計 竣工検査状況
